



RAPPORT SUR LE SUIVI CITOYEN DES POLITIQUES PUBLIQUES PAR LES JEUNES DANS LA COMMUNE D'ÉSÉKA



Site web: www.communed'eseka.com

Facebook: Commune d'eseka official

**Année
2023-2024**

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
SIGLES ET ACRONYMES	2
I. INTRODUCTION GENERALE	3
II. CONTEXTE.....	4
1. Méthodologie.....	4
a. Phase préparatoire	4
b. Phase d'appropriation et de collecte des données	4
c. Phase d'analyse et de mise en forme des résultats	5
III. DÉLIMITATION DE L'ENQUÊTE ET FINALITÉ DU RAPPORT	5
IV. LES LIMITES/ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN	5
V. LES PROJETS DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIQUE 2024 COMMUNE D'ÉSÉKA	6
1. PROJET BIP 2024 COMMUNE D'ÉSÉKA	6
2- PROJET SOUS FONDS PROPRE COMMUNE D'ÉSÉKA	7
VI. LES INFORMATIONS COLLECTÉES SUR LE TERRAIN	7
VII. RECOMMANDATIONS	12
VIII. CONCLUSION GÉNÉRALE.....	13
IX- ANNEXES	14

SIGLES ET ACRONYMES

- ❖ **GPE** : Groupe
- ❖ **EP** : École Primaire
- ❖ **PMH** : Puits à Motricité Humaine
- ❖ **CSI** : Centre de Santé Intégré
- ❖ **CMA** : Centre médical d'Arrondissement
- ❖ **EM** : Ecole Maternelle
- ❖ **ADISI-Cameroun** : Association pour le Développement Intégré et la solidarité Interactive
- ❖ **BIP** : Budget d'Investissement Public
- ❖ **GIC** : Groupe Inter Communal
- ❖ **CTD** : Collectivités Territoriales Décentralisées
- ❖ **MINMAP** : Ministère des Marchés Publics
- ❖ **MINEPAT** : Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
- ❖ **MINADER** : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
- ❖ **MINEPAT** : Ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire
- ❖ **MINSANTE** : Ministère de la Santé
- ❖ **MINMAP** : Ministère des marchés publics
- ❖ **MINDDEVEL** : Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
- ❖ **MINTP** : Ministère des Travaux Publics
- ❖ **MINPMEESA** : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat
- ❖ **MNTOUL** : Ministère du Tourisme et des Loisirs
- ❖ **MINEE** : Ministère de l'Eau et de l'Énergie
- ❖ **MINAS** : Ministère des Affaires Sociales
- ❖ **MINEDUB** : Ministère de l'Education de Base

I. INTRODUCTION GENERALE

Au Cameroun, les collectivités locales décentralisées sont régies par la loi 2019/024 portant code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Cette loi vient révolutionner les pratiques institutionnelles des 360 communes et 14 communautés urbaines que compte l'ensemble du pays, dont la plupart s'est dotée de nouveaux exécutifs qui sont en fonction depuis février 2020.

Dans l'optique de promouvoir la redevabilité et la réédition des comptes par des outils numériques, la #CivicTech dont l'usage était resté étranger par beaucoup de communes, plusieurs actions ont été entreprises par notre organisation depuis au moins 3 ans, afin de doter les municipalités du « Hub Communes Ouvertes » d'outils numériques afin de promouvoir l'accès à l'information et aux données publiques locales, la participation citoyenne. Cette approche qui utilise le digital, vise en somme à favoriser un rapprochement entre les élus et les citoyens/électeurs.

Au regard de nos interventions dans les communes de Makénéné, Loum, Penja et Eséka à destination d'une cible jeunes et représentatifs des différentes couches sociologiques réparties en 60% de garçons et 40% de filles, plusieurs actions ont été menées. Il s'agit de la construction des plateformes numériques pour favoriser l'accès à l'information et l'Open Data local afin de stimuler la participation citoyenne, plusieurs jeunes ont été formés sur les questions liées aux politiques, à l'utilisation intelligente des outils numériques. En bref les jeunes ont été outillés pour s'impliquer dans les actions de développement de leur localité.

Dès lors, ces jeunes ont effectué des descentes sur le terrain pour collecter les données sur les politiques publiques notamment les projets financés par le budget d'investissement publique (BIP) et les projets financés par les fonds propres de la Mairie.

Le présent rapport qui est le fruit des actions menées sur le terrain par les jeunes, se veut être un outil de plaidoyer auprès des exécutifs communaux afin d'améliorer la qualité du service de l'information et bien d'autres actions de renforcement institutionnel et politique local pour un développement efficace et efficient.

II. CONTEXTE

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet « Appui à la digitalisation de la participation citoyenne dans les communes de Loum, Penja, Makénéné et Eséka ». Le projet ambitionne de renforcer la participation citoyenne et l'accès à l'information dans les municipalités réunies au sein du « Hub Communes Ouvertes » ; pour amener les jeunes à s'intéresser aux politiques publiques, à contribuer à l'élaboration de celles-ci tout en assurant le suivi par des mécanismes techniques et technologiques appropriés.

1. Méthodologie

Ce travail s'est déroulé en trois phases :

a. Phase préparatoire

Cette phase peut se regrouper en deux étapes :

- Les ateliers de formations à l'endroit des jeunes des quatre Communes ci-dessus énumérées, par des experts sur des modules en rapports aux questions des politiques publiques, le numérique et ses usages :
 - ~ La formation des jeunes de la Commune d'Eséka les 18 et 19 juin 2020 ;
 - ~ La formation des jeunes de la Commune de Makénéné les 22 et 23 Juillet 2021 ;
 - ~ La formation des jeunes de la Commune de Loum les 23 et 24 Novembre 202 ;
 - ~ La formation des jeunes de la Commune de Penja les 16 et 17 Juin 2022.
- Les ateliers de mutualisation d'expériences entre les jeunes et les conseillers municipaux, pour le partage des bonnes pratiques en matière de participation citoyenne au niveau local :
 - ~ Le premier atelier de mutualisation d'expériences a regroupé les participants de la commune de Makénéné et ceux de la commune d'Eséka à l'hôtel de ville d'Eséka les 26 et 27 Avril 2023 ;
 - ~ Le second a regroupé les participants de la commune de Penja et ceux de la commune de Loum à l'hôtel de ville Loum le 1er et 2 juin 2023.

b. Phase d'appropriation et de collecte des données

Elle a consisté à :

- La familiarisation avec les outils de collecte par les jeunes délégués ;
- La collecte des données auprès des acteurs de développement (les autorités locales et les agents communaux, les services techniques déconcentrés, etc.).

c. Phase d'analyse et de mise en forme des résultats

Le travail s'est conclu par :

- Le croisement et le traitement des données collectées sur le terrain par les jeunes délégués ;
- La rédaction d'un premier draft de rapport ;
- L'intégration des amendements de la Mairie et rédaction du rapport final.

III. DÉLIMITATION DE L'ENQUÊTE ET FINALITÉ DU RAPPORT

Ce travail couvre la période allant de Janvier à Octobre 2024 et porte sur le suivi des politiques publiques mises en œuvre dans la commune d'Eséka pour le compte de l'année 2024.

Ce rapport est élaboré sur la base des informations collectées sur le terrain. Il servira d'outil aux conseillers municipaux pour jouer un rôle important dans le dispositif en remontant les contributions des jeunes à l'élaboration du budget communal (budget participatif) et la conception des projets locaux. La plateforme de commune [d'Eséka](#) que nous avons construit pour faire enregistrer des doléances des quartiers, permettra également la centralisation de celles-ci par le responsable chargé de la gestion de la plateforme. Il les transmettra aux délégués des quartiers ou aux conseillers, pour consolider ceux en leur possession ; afin d'encourager et promouvoir la participation citoyenne au niveau local.

IV. LES LIMITES/ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN

Les descentes sur le terrain se sont déroulées normalement comme l'a indiqué la plupart des jeunes. Toutefois, plusieurs difficultés ont été rencontrées par les jeunes, notamment :

- L'existence de fortes pluies au moment où on se déployait sur le terrain.
- Le mauvais état de certaines routes communales.

V. LES PROJETS DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIQUE 2024 COMMUNE D'ÉSÉKA

1. PROJET BIP 2024 COMMUNE D'ÉSÉKA

L'année 2024 a vu le lancement de 14 projets BIP dans la commune d'Éséka présents sur le tableau ci-dessous avec les détaille important :

[illegible]

2- PROJET SOUS FONDS PROPRE COMMUNE D'ESÉKA

Cette année 2024, il n'y a eu aucun projet sous fond propres. Les fonds propres nécessitent une capacité d'autofinancement et une gestion rigoureuse de la part des communes, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre et les projets sous fonds propres sont souvent plus risqués et plus incertains que les projets financés par le budget d'investissement publique, ce qui peut décourager certaines initiatives locales. Mais malgré cela nous encourageons plus de projet sous fonds propre afin de motiver le développement dans la commune d'Eséka.

VI. LES INFORMATIONS COLLECTÉES SUR LE TERRAIN

1. SUIVI PHYSIQUE DES PROJETS BIP 2024


Les jeunes ont récolté et présenté les données qui sont présentées dans le tableau ci-dessous :

N°	Projets	Bailleurs	Montants (Fcfa)	Délais	Pourcentages de réalisation	Statuts	Observations
1	L'équipement du centre de santé intégré de BOGSO	MINSANTE	6 000 000	2 mois	100%	Achevé	Livraison effectuée sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire
2	L'équipement du centre de santé intégré de SONG BADJECK	MINSANTE	6 000 000	12 mois	100%	Achevé	Livraison effectuée sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire
3	L'équipement du centre de santé intégré de NGUIBASSAL 2	MINSANTE	6 000 000	12 mois	100%	Achevé	Livraison effectuée sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire
4	L'équipement du centre de santé de MANGUENGUES	MINSANTE	6 000 000	2 mois	100%	Achevé	Livraison effectuée sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire
5	L'équipement du centre de santé intégré urbain d'Eséka	MINSANTE	6 000 000	2 mois	100%	Achevé	Livraison effectuée sanctionnée par un procès-verbal de réception provisoire
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes avec bloc administratif à l'école maternelle groupe 1 l(aviation)	MINEDUB	25 000 000	4 mois	75/%	En cours	Travaux en cours
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes avec bloc administratif à l'école publique bilingue d'Eséka	MINEDUB	25 000 000	4 mois	75%	En cours	Bel et bien débuté
8	TRAVAUX D'électrification du village NJOCK	MINDDEVEL	50 000 000	3 mois	100%	Achevé	Réalisé
9	Travaux de réhabilitation de la piste agricole école publique de LISSAI- MNLOH MALOUME.	MINADER	23 000 000	3 mois	40%	En cours	Suspension des travaux à cause des pluies

[illegible]

Il ressort du tableau ci-dessus qu’au total 14 projets du Budget d’Investissement Public ont été votés pour être mis en œuvre dans la commune d’Eséka année 2024. Il en ressort également que 08 projets sur 14 sont achevés, 06 projets sur 14 sont en cours de réalisation. D’après les informations qui ont été collectées sur le terrain par les jeunes de la commune.

Taux de mise en oeuvre des projets BIP 2024

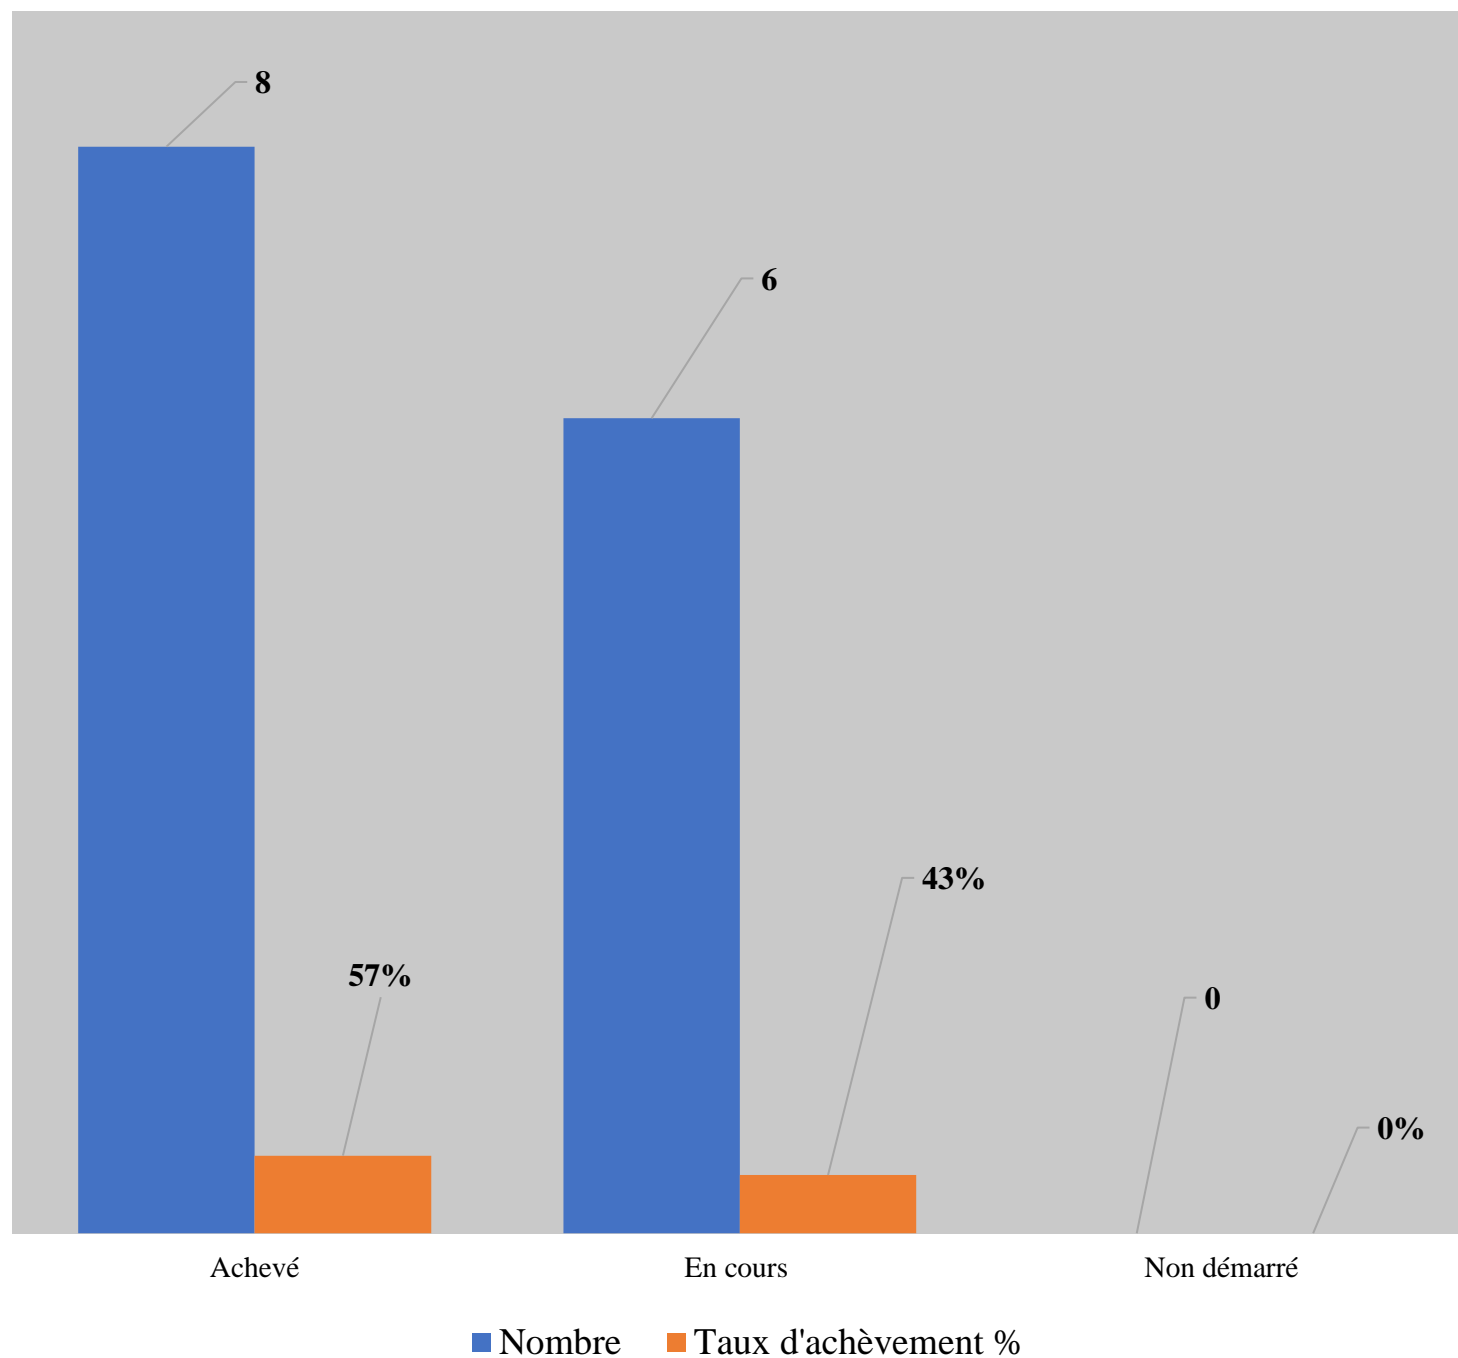

SITUATION PHYSICO FINANCIERE BIP 2024 MOIS D'OCTOBRE 2024

N°	APPELS D'OFFRES/DEMANDE DE COTATION	MONTANT PREVISIONNEL	NOM PRESTATAIRE	TP	TF	OBSERVATIONS
1	Construction d'un forage équipé de PMH à BISSOMBE (LIPOMBE)	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MINLONGO	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
3	Construction d'un forage équipé de PMH à LIMOUG-LIHOG	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
4	Construction d'un forage équipé de PMH à ILANGA	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
5	Construction d'un forage équipé de PMH à NGOG-TOS	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
6	Construction d'un forage équipé de PMH à LIKABO	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
7	Construction d'un forage équipé de PMH à BONBE	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
8	Construction d'un forage équipé de PMH à SONG-NDENG	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
9	Construction d'un forage équipé de PMH à SONG-SONG HOTH	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
10	Construction d'un forage équipé de PMH à BONDJOCK	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
11	Construction d'un forage équipé de PMH à SNEC	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
12	Construction d'un forage équipé de PMH à TETEM	8 500 000	SOTRASOL SARL	100%	0%	Travaux exécutés et réceptionnés
13	Electrification rurale du village Njock dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre en procédure d'urgence	50 000 000	MARTEAU SERVICE SARL	100%	100%	Travaux réceptionnés
14	Réhabilitation de la piste agricole école publique Lissai-Menloh Maloume dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du Centre en procédure d'urgence	23 000 000	ETS JACOB CONSTRUCTION	40%		-En cours d'exécution -Quelques difficultés liées à la pluviométrie
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif a l'école publique bilingue d'Eséka (lot 1) dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre en procédure d'urgence	25 000 000	SYSTEM SARL	75%	0%	En cours d'exécution
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif a l'école maternelle groupe 1 aviation (lot 2) dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du Centre en procédure d'urgence	25 000 000	SYSTEM SARL	75%	0%	En cours d'exécution
17	Réhabilitation du tronçon de route en pave mosquée-ancienne gendarmerie 150 mètres dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre en procédure d'urgence	45 500 000	ETS NJP	3%	0%	-En cours d'exécution avec pose plaques de chantier et début de curage des caniveaux.
18	Réhabilitation de la route Bogso-Limoug Lihog et bretelles dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre en procédure d'urgence	120 000 000	AIR FORAGE SARL	0%	0%	-Contrat signé par l'Administrateur du Fonds routier et le Maitre d'Ouvrage. -Marché notifié à l'Entreprise Adjudicataire. -OS démarrage travaux en cours.

19	Equipement en matériel médical des centres de sante intégrés de : Song-Badjeck ; Bogso ; Nguibassal II ; Manguengues ; CSIU d'Eséka dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre	30 000 000	LES CHAMPIGNONS D'ESEKA	100%	70%	-Equipements livrés ; -PV de réception provisoire signé le 11/09/2024
20	Equipement en tables bancs et deux bureaux de maitre à l'école publique bilingue d'Eséka dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre (lot 1)	5 000 000	ETS FRERES ET AMIS	95%	0%	Livraison exécutée
21	Equipement en tables bancs et deux bureaux de maitre à l'école maternelle groupe 1 aviation d'Eséka dans l'arrondissement d'Eséka, département du Nyong et Kelle, région du centre (lot 2)	5 000 000	ETS FRERES ET AMIS	100%	0%	Livraison exécutée
22	Construction d'un centre multimédia et spectacle a Eséka 2	20 000 000	ETS JACOB CONSTRUCTION	0%	0%	Lettre commande notifiée, OS démarrage des travaux en cours
	TOTAL		450 000 000			

2. SUIVI PHYSIQUE DES PROJETS SOUS FONDS PROPRES 2024

Comme indiqué plus haut il n'y a pas eu de projet mis en œuvre sous fonds propres de la Mairie cette année par conséquent aucune donnée n'y a été collectées.

VII. RECOMMANDATIONS

Après les nombreuses activités effectuées sur le terrain, quelques recommandations sont proposées pour faciliter le travail et améliorer la qualité et la quantité des données récoltées lors de la prochaine décente, notamment :

❖ A l'organisation partenaire (ADISI-Cameroun) :

- Fournir des parapluies, bottes et manteaux aux jeunes afin de faciliter leur mobilisation sur le terrain pendant les moments de pluies ;
- Prévoir suffisamment de fonds pour pallier aux multiples descentes dû à l'absence du personnel administratif ;
- Prévoir des appareils photos numériques.

❖ A la structure bénéficiaire (la Mairie d'Eséka)

- Désigner un ou plusieurs agents référents pour répondre aux demandes d'information des jeunes. Ces agents pourraient être contactés par téléphone pour limiter les déplacements non fructueux des jeunes ;
- Expliquer aux prestataires la nature et les objectifs de la mission des jeunes pour lever les éventuels malentendus. Une lettre d'introduction officielle de la mairie pourrait également rassurer les prestataires.

❖ A l'attention des jeunes

- Identifier les jours et horaires où le personnel indiqué est généralement présent et adapter les déplacements en fonction. Contacter si possible les responsables administratifs par téléphone pour convenir de rendez-vous fixés à l'avance ;
- Utiliser des outils de communication comme la messagerie instantanée (WhatsApp, par exemple) pour poser certaines questions directement, sans nécessiter de présence physique systématique ;
- S'en tenir à la période définie pour la collecte des données sur le terrain et faire des retours en cas de soucis/ difficultés rencontrées sur le terrain aussitôt que possible.

VIII. CONCLUSION GÉNÉRALE

En conclusion, la descente des jeunes délégués dans la commune d'Eséka a permis à ceux-ci d'aller en immersion sur le terrain ; afin de toucher du doigt les projets de développement mis en œuvre au sein de leur localité. Cette activité a été également l'occasion pour eux de mettre en pratique les connaissances qu'ont dispensées les experts lors des différentes formations et ateliers de mutualisation sur les questions de politiques publiques et la participation citoyenne locale. On peut à cet effet noter que le suivi des politiques publiques par les jeunes dans l'arrondissement d'Eséka s'est effectivement défini comme étant un véritable point d'ancrage pour la participation citoyenne en particulier, l'OpenData, la gouvernance locale. Il serait davantage intéressant de renforcer les efforts déjà engagés par les différentes entités pour consolider ce processus ; afin de contribuer à faire perdurer les actions lancées dans le cadre de cette initiative au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; les communes pour le cas d'espèce. Il est important de relever au final que l'activité de collecte menées par les jeunes délégués pour l'élaboration du présent rapport/ document de plaidoyer, leur a permis non seulement de se rapprocher de l'exécutif en exercice dans leur commune, mais aussi de contribuer en tant qu'acteur dans le processus de développement au sein de leur localité pour le compte de l'année 2024.

IX- ANNEXES



BIP 2024 : L'équipement du centre de santé intégré de



BIP 2024 : Travaux de réhabilitation de la piste agricole école publique de LISSAI- MNLOH MALOUMF



BIP 2024 : L'équipement du centre de santé intégré urbain d'Eséka



BIP 2024 : L'équipement en tables bancs et deux bureaux de maitre à l'école maternelle du groupe I(aviation)



BIP 2024 : Construction d'un bloc de deux salles de classes avec bloc administratif à l'école maternelle groupe 1(aviation)



BIP 2024 : Construction d'un bloc de deux salles de classes avec bloc administratif à l'école publique bilingue d'Eséka



BIP 2024 : Travaux d'aménagement de la voirie urbaine carrefour ancienne gendarmerie - mosquée



BIP 2024 : Construction d'un centre multimédia et spectacle



BIP 2024 : Construction de 12 forages équipés de PMH dans l'arrondissement d'Eséka
